

Bijlage 7 keuring zone-
proden (rechtst)
nr 6



Verslag

VERSLAG NR

GEN/15/61312974/01/NL/000

Verbeterd origineel



040 - INSP

DIT VERSLAG GEN/15/61312974/01/NL/000 ANNULEERT EN VERVANGT HET VERSLAG GEN/15/61312974/00/NL/000.

Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

Polderstraat 6 - 9470 Denderleeuw



Uitgevoerd op:

28/02/2024 16:09 - 16:23



Uitgevoerd door: BART TONNELIER (3521)

Conform

IDENTIFICATIE VAN DERDEN

Opdrachtgever van de controle

Naam, Voornaam

Adres

Eigenaar, uitbater of beheerder

Naam, Voornaam

Adres

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk

Naam, Voornaam

Adres

IDENTIFICATIE VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Vincotte ID

100 254 341

Adres

Polderstraat 6 - 9470 Denderleeuw

EAN-code

541448860023484492

Netbeheerder naam

Fluvius

Nr Teller

1SAG3200072767

Teller index dag

13

Teller index nacht

29

Type installatie

HUISHOUELIJKE Inst.

VINCOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)

Maatschappelijke zetel : Jan Olievierslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 - buildingnorth@vincotte.be

BTW BE 0402 726 875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

Uitgiftedatum: 19/03/2024

1 / 8



Verslag

Verbeterd origineel

VERSLAG NR
GEN/15/61312974/01/NL/000

GEGEVENS VAN DE CONTROLE

De controle wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (B.S. van 28/10/2019), in dit document "Boek 1" genoemd.

Type controle	-	Gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)
Datum van de uitvoering van de installatie	-	Vanaf 01/06/2023
Informatie inhoud controle	-	Alleen de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden gecontroleerd.
Afwijkingen	-	Geen
Aanwezigheid van specifieke installatie	-	Fotovoltaïsche installatie
Betreft de controle enkel de specifieke installatie?	-	Ja

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Spanning (V)	400+N
Aard van de stroom	Driefasig
Type van aardelektrode	Aardingslus
Voedingsleiding - Type	VOB
Voedingsleiding - Doorsnede (mm ²)	10
Aantal eindstroombanen	2
Type van het aardverbindingssysteem	TT
Huidige nominale waarde van de bescherming van de aansluiting (A)	25
Installatie ontworpen voor een maximale nominale stroom van (A)	25
Geplaatste (alg.) differentieelstroominrichtingen	1

Differentieel	In(A)	Gevoeligheid (mA)	Type
Hoofd	40	300	A



Verslag

Verbeterd origineel

VERSLAG NR
GEN/15/61312974/01/NL/000

Beschrijving van de elektrische installatie


ALSB

Plaats Garage

Aantal
differentieelstroominrichtinge
n 1

Waarde van het algemeen
isolatieniveau (M Ω) 1.4

Aantal stroombanen 2

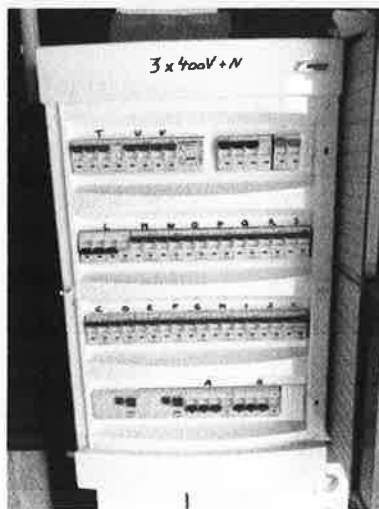

(Uitwendige foto)

Type of aarding Aardingslus

Waarde (Ω) 4.16



Verslag

Verbeterd origineel

VERSLAG NR
GEN/15/61312974/01/NL/000

Fotovoltaïsche installatie: gegevens panelen

Type	Qpeak G11
Vermogen (W)	400
Merk	QCells
Aantal	9
Totaal nominaal vermogen (W)	3600



(Foto)

PV omvormer

Type	S6-GR105K
Merk	SOLIS
Serienummer	1002050235110297
Vermogen (kW)	5
Aantal	1

SCHEMA'S, PLANNEN EN DOCUMENTEN VAN DE INSTALLATIE

Stroombaanschema - referentie	PV installatie
Stroombaanschema - versie	0.1
Stroombaanschema - datum	18/03/2024
Eendraadsschema	Zie bijlagen
Situatieplan - referentie	PV installatie
Situatieplan - versie	0.1
Situatieplan - datum	18/03/2024
Situatieplan	Zie bijlagen



Verslag

Verbeterd origineel

VERSLAG NR
GEN/15/61312974/01/NL/000

RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Uitgevoerde controles

Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen	In orde
Staat van het vast geïnstalleerd elektrische materieel	Ok
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking	Ok
Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	In orde
Visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	N.V.T.

Metingen en beproevingen

Spreidingsweerstand van de aardverbinding(en) (Ω)	4.16
Waarde van het algemeen isolatieniveau ($M\Omega$)	1.4
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (testknop)	Ok
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (foutlus)	Ok
Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders	Ok

Vastgestelde inbreuken

- Nihil

Opmerkingen

- Nihil



Verslag

Verbeterd origineel

VERSLAG NR

GEN/15/61312974/01/NL/000

BESLUIT VAN DE CONTROLE

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 (KB van 8/09/2019) inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór 28/2/2049.

De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden reeds verzegeld.

Ir F. Dewint
Directeur Generaal

VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.



Verslag

Verbeterd origineel

VERSLAG NR
GEN/15/61312974/01/NL/000

Bijlagen

Foto situatieplan (1/1)

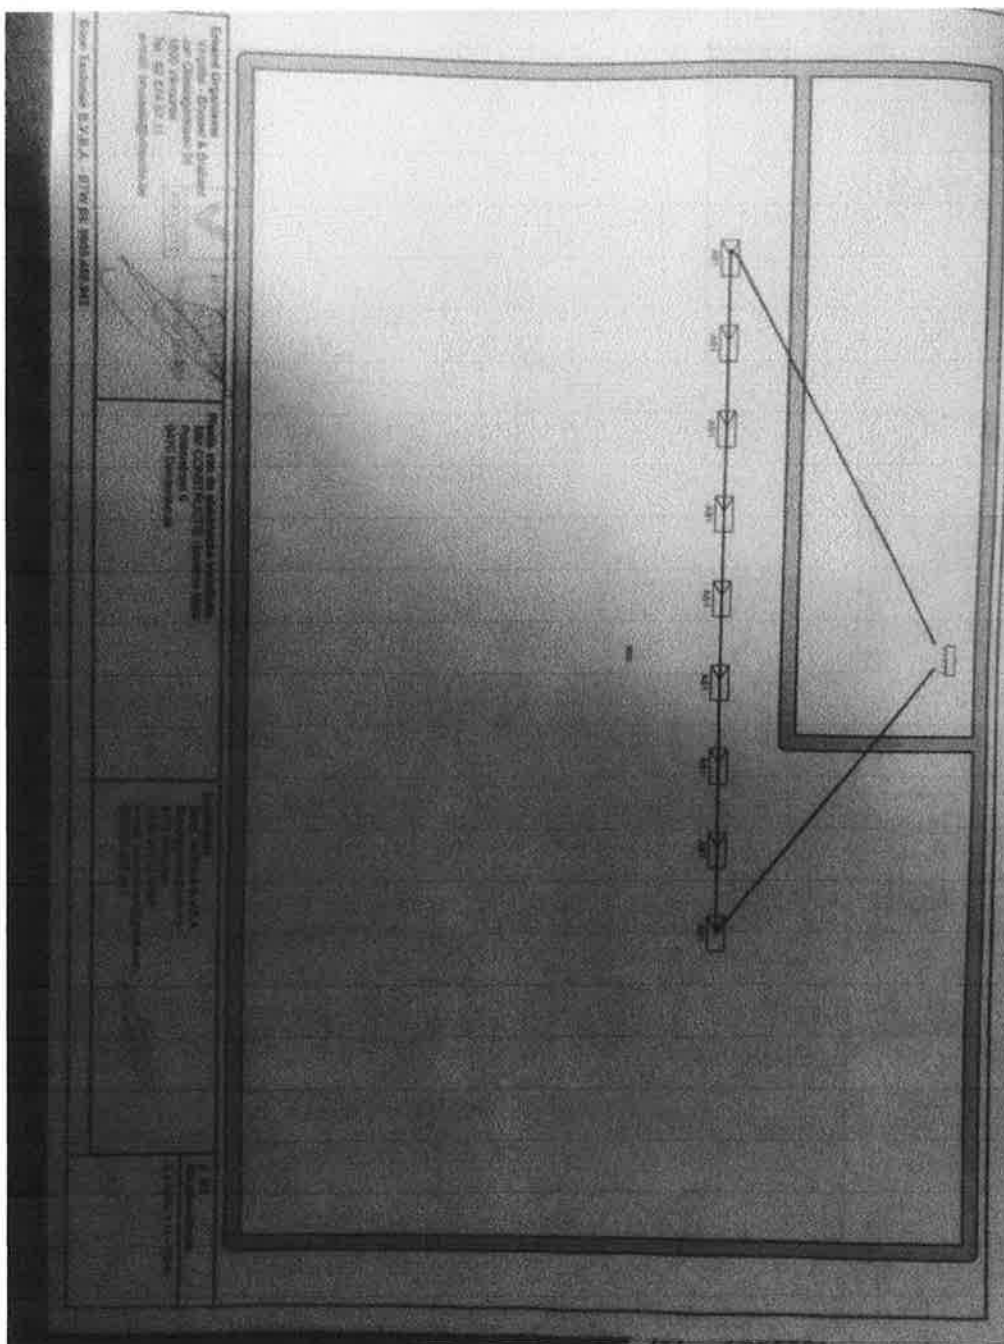


Foto van de eendraadschema's (1/1)

