

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 24/02/2022
Inspecteur: Manuel T'jampens
ID-label: LS hofstraat 51A 201, 9100 Sint Niklaas
B.T.W. nr.: BE 0458 832 566
Merk en type meettoestel: Meter MI3155 Serienummer: 21251312

Mentor: -
Klantreferentie:

Installateur: PSPM BV

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Hofstraat
Huisnummer 51
Busnummer A201
Postcode 9100
Gemeente Sint-Niklaas
Land België

Eigenaar

Naam PSPM BV
Straatnaam Hofstraat
Huisnummer 51
Busnummer A201
Postcode 9100
Gemeente Sint-Niklaas
Land België

Installateur

Naam PSPM BV
BTW nr. BE 0458 832 566
Telefoonnummer 014 89 18 10
E-mail Tim@pspm.be

Type : appartement

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448860022018896



Teller Nr. : 1SAG3100419522


Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS
Aantal borden: 1

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.
Spanning: 3N400V
Meter / bord verbinding: 10 mm²
Max beveiliging: 25 A
Aantal kringen: 12

Ri algemeen: 1,86 MΩ

OK



Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders

RE: 5,89 Ω

OK

**DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING**

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I:t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	12	NVT	NVT
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	5	NVT	NVT

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
1	C	25		2	6
11	C	16		2	2,5
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 12 De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

nota/note 12: De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

BESLUIT

☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 24/2/2047

☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 2

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Manuel T'jampens

De werknemer,

Manuel T'Jampens
ACEG VZW #135

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit


- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 24/2/2047	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

ORIGINEEL

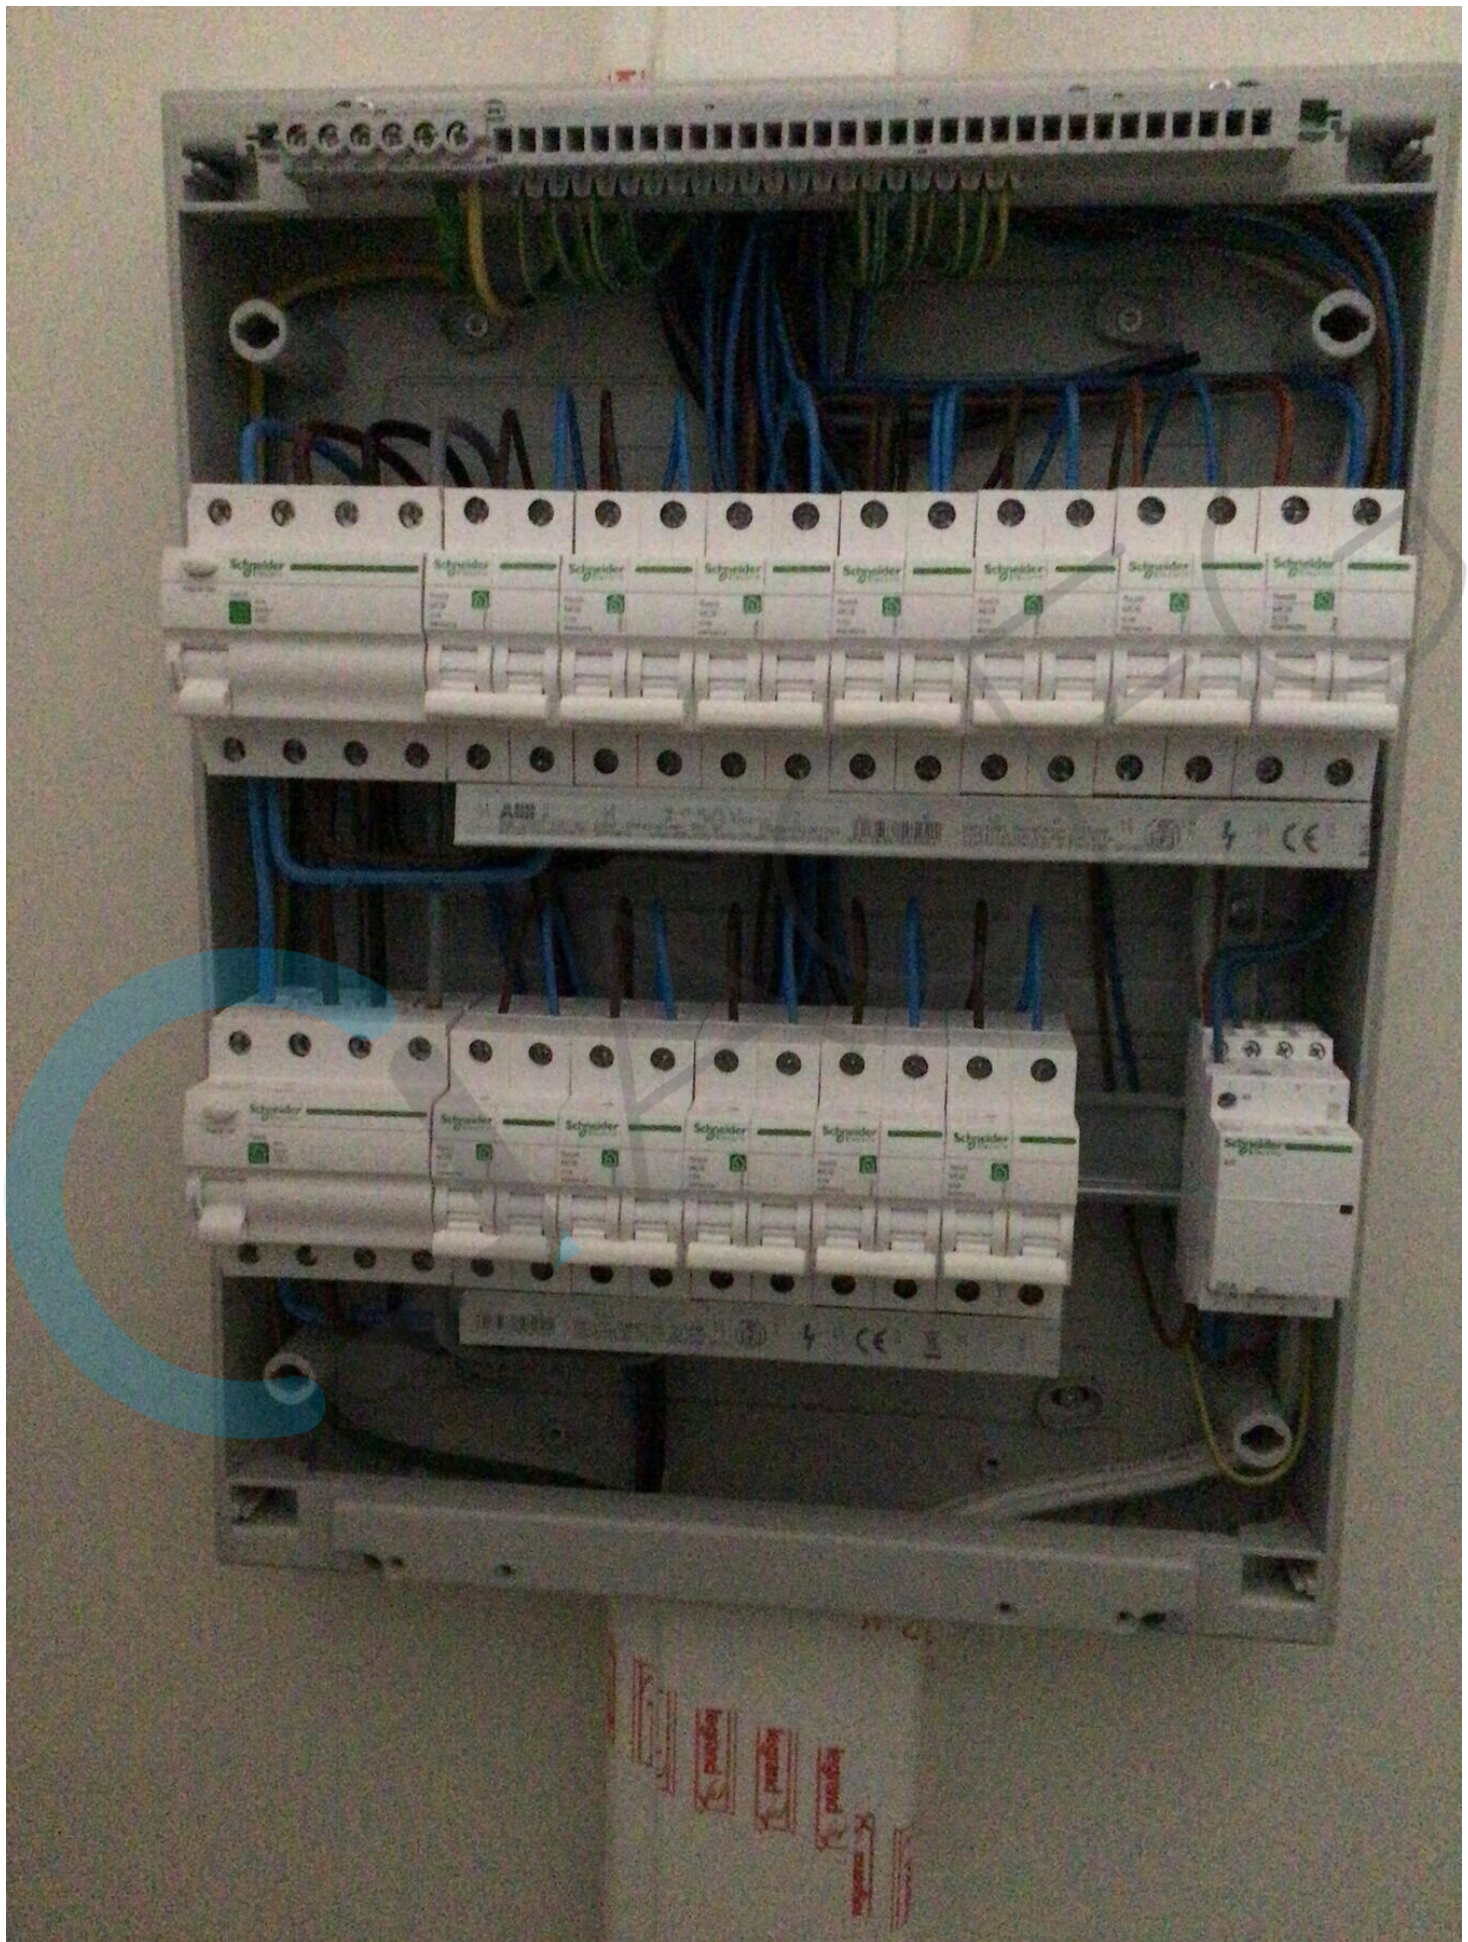

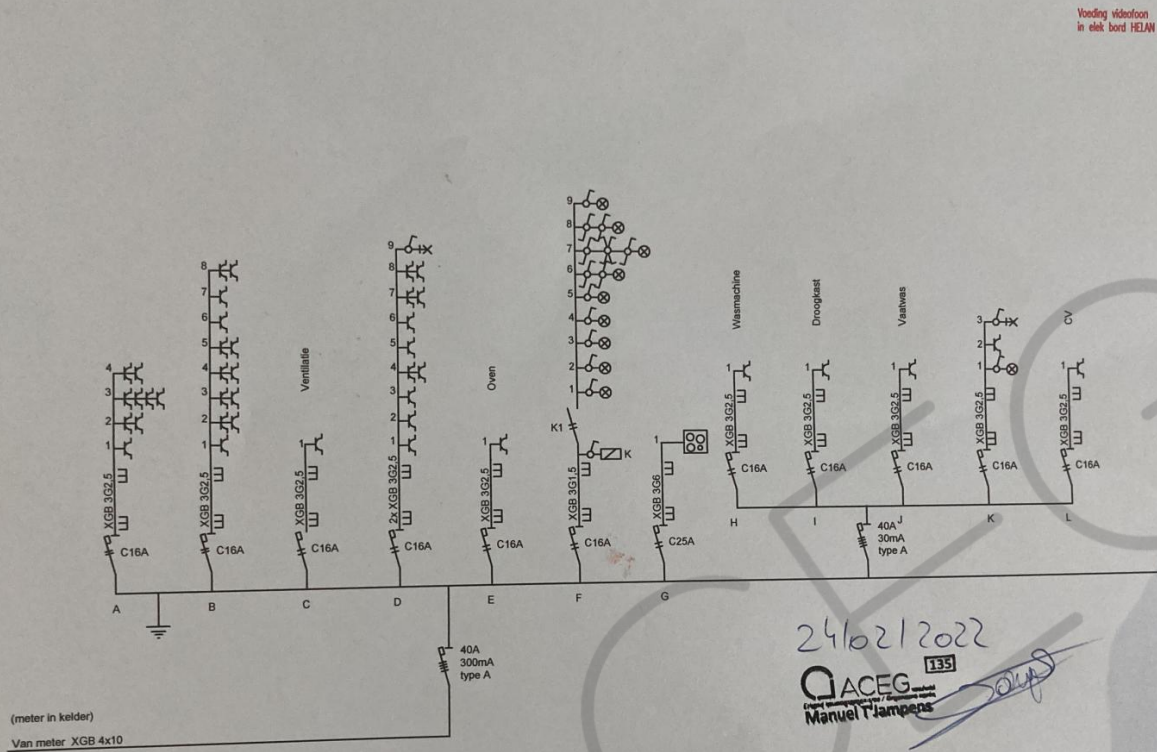

PSPM
PROPERTY SERVICE - PROJECT MANAGEMENT
General Solutions for Building Problems

T: 014 00 10 10
info@pspm.be
www.pspm.be


Hofstraat 51A/201
9100 SINT-NIKLAAS

Bordenplan elektriciteit
appartement 51A/201

Project :

31/01/2022

handtekening + stempel
keuring

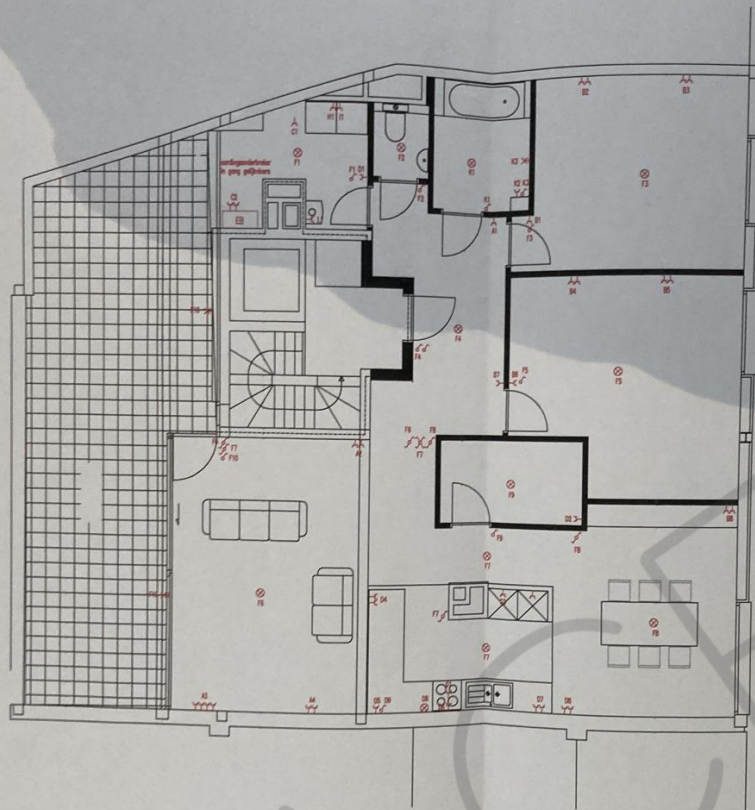

24/02/2022
QACEG
 Manuel Tjampens

PSPM
 PROPERTY SERVICE - PROJECT MANAGEMENT
 General Solutions for Building Problems

T: 014 60 18 10
 info@pspm.be
 www.pspm.be

Hofstraat 51A/201
 9100 SINT-NIKLAAS

Grondplan elektriciteit
 appartement 51A/201

Project : 31/01/2022

handtekening + stempel
 keuring



