

3474115

16/04/60/536

EAN nr. :
 Teller nr. : 5088 318
 Stand I : 76895,1 II : _____

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : ~~veiligheidsonderzoek~~ / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 67~~ / ~~AREI art. 270~~ / AREI art. 271 / AREI art. 276bis /
 Aanvulling verslag nr. OCB 4526830 (25/03/2015)
 Aard installatie : ~~Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig~~ / Bestaande / ~~Verzwaren / Spijlsing meter / Spanningswijziging~~ / Verkoop wooneenheid
 Type der lokalen : WONING
 Plaats van onderzoek : BOSSSTRAAT 28 1708 GROOT-BIJGAARDEN
 Eigendom van : MIR DELSTRIJCK ERIK
 Opdrachtgever : MIR DELIERE MICHAEL KOOILWITTE 20 1700 NUBEEK
 Installateur : idem
 BTW BE 084.015.614 ID-kaart : _____ Uitgereikt te : _____ Datum : _____
 Onderzoeker : JURGEN MOENS Datum van onderzoek : 18/04/2016

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V ~~3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : 3 x 32 A Omschakelaar: stand : _____
 Hoofdbeveiliging : Zek. : 3 x 32 A Schak. : 4 / OCB / C60 A 300 mA
 Meter-bordverbinding : kabeltype : WB aantal geleiders : 4 doorsnede : 6 mm²
 Voedingsbekabeling : kabeltype : _____ aantal geleiders : _____ doorsnede : _____ mm²
~~Boveldraadschakelaar / onderdraadschakelaar / onderdraadschakelaar met Wachtbuis geplaatst / niet geplaatst - koudte plaat aanwezig / niet aanwezig~~
 Aardelektrode : Type : ~~hls / baren / pennen / horizontale geleiders~~ Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 17 Ω
 Aantal borden : 2 Aantal eindstroombanen : 11 + 4 Algemene isolatieweerstand : 0,61 MΩ
 Diff. schak. : algemene : 4 / 60 A 300 mA / 40 A mA bijkomende : 4 / 60 A 300 mA / 40 A mA
 werking testknop : in orde - niet in orde controle foutlus : in orde - niet in orde
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - neen Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde
 Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde
 Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde
 Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen

FASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N Hoofdequipotentiale bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.
N Badkamer aarding waterleiding CV ketel nog niet geplaatst.

① GEEN.

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd - ~~door de zelfde organisatie~~ - uiterlijk op 18/04/2016
 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging
 of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag / mag niet in dienst gesteld
 worden / blijven indien zonder vertoning wordt voldaan aan de voorgeselde inbreuken en de gepaste
maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
 de onderzoeker

JURGEN MOENS
 Kruiskouterstraat 59
 O.C.B. 1750 Lennik
 02269.07.07 0475/45.23.82

erkend controle organisme
 vereniging zonder winst oogmerk
 gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
 Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
 info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
 PC 000-0162392-14
 Bank 405-3020501-49

2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
 rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
 energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en

NOTA HUIJPDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht :
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische

03/005N/05/13/15D

Kast naast teller

- A. Differentieel algemeen
- B. Differentieel vochtige ruimtes
- C. Hoofd zekering kast voor keuken
- D. Licht badkamer+ stopcontacten badkamer + stopcontacten grote slaapkamer + slaapkamer er naast
- E. Verwarming
- F. Stopcontact kelder
- G. Alarm
- H. Licht gang boven +slaapkamer 3+4
- I. Licht kelder + wc's
- J. Licht kelder stopcontact keuken + living
- K. Licht kelder verwarming +stopcontact bureau
- L. Licht gang kelder +keuken + gang
- M. Stopcontacten bord +stopcontact achter bord+ licht bureau
- N. Bel

Klant
Erik Deschrijver
Bosstraat 28
1700 dilbeek

9102 '70 '81

Jurgén MOENS
inspecteur
O.C.B.
Kruiskouterstraat 59-1750 Lennik
☎ 02 269.07.07 e 0475/45.23.82

uitvoerder
Delière Michaël
koolwitje 20
1700 dilbeek

Kast keuken


- O. Hoofdzekering
- P. Kookplaat
- Q. Oven
- R. Stopcontacten keuken + licht boven aan lavabo + dampkap
- S. Stopcontacten keuken+ slaapkamer 3+4

Klant
Erik Deschrijver
Bosstraat 28
1700 dilbeek

18. 04. 2016
Jürgen MOENS
inspecteur

O.C.B.
Kruiskouterstraat 59-1750 Lennik
☎ 02-269.07.07 • 0475/45.23.82

uitvoerder
Delière Michaël
koolwitje 20
1700 dilbeek

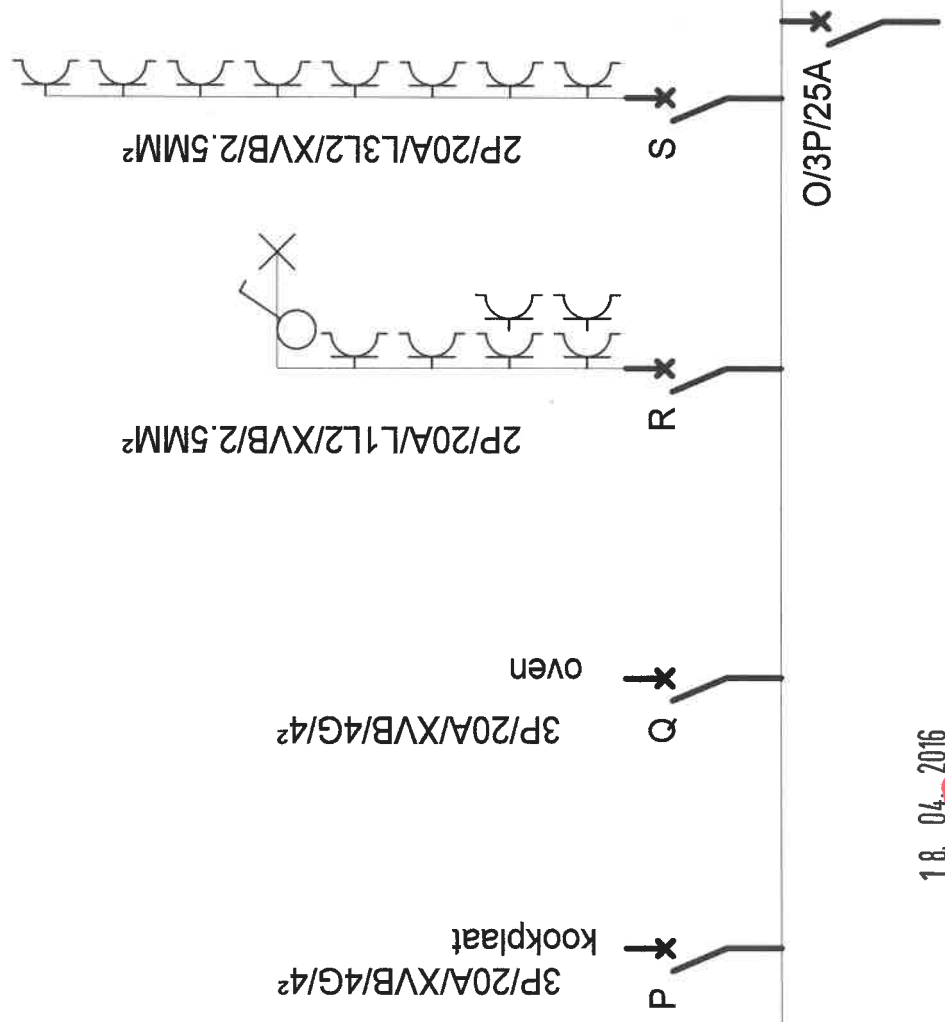


18.04.2016
Jürgen MOENS
 inspecteur
O.C.B.
 Kruiskouterstraat 59 1750 Lemmink
 ☎ 02-269.07.07 • 0475-45.23.82

Deschrijver Erik bosstraat 28 1700 dilbeek	Titel van het bestand		eendraadschema		Ontvanger	Datum	Wijzigingen	Datum van het bestand	
					Dellere michaël			4/4/16	
	OnderTitel van het blad				Tekenaar			Datum van het blad	
					koolwifje 20			5/4/16	
					Verificateur				
			eendraadschema kast keuken		1700 dilbeek	Dit blad wordt door het programma SEE TECHNICAL van de groep IGE-XAO ontworpen.			3/3

Dit blad wordt door het programma SEE TECHNICAL van de groep IGE-XAO ontvraagd

1 2 3 4 5 6 7 8


A B C D E F

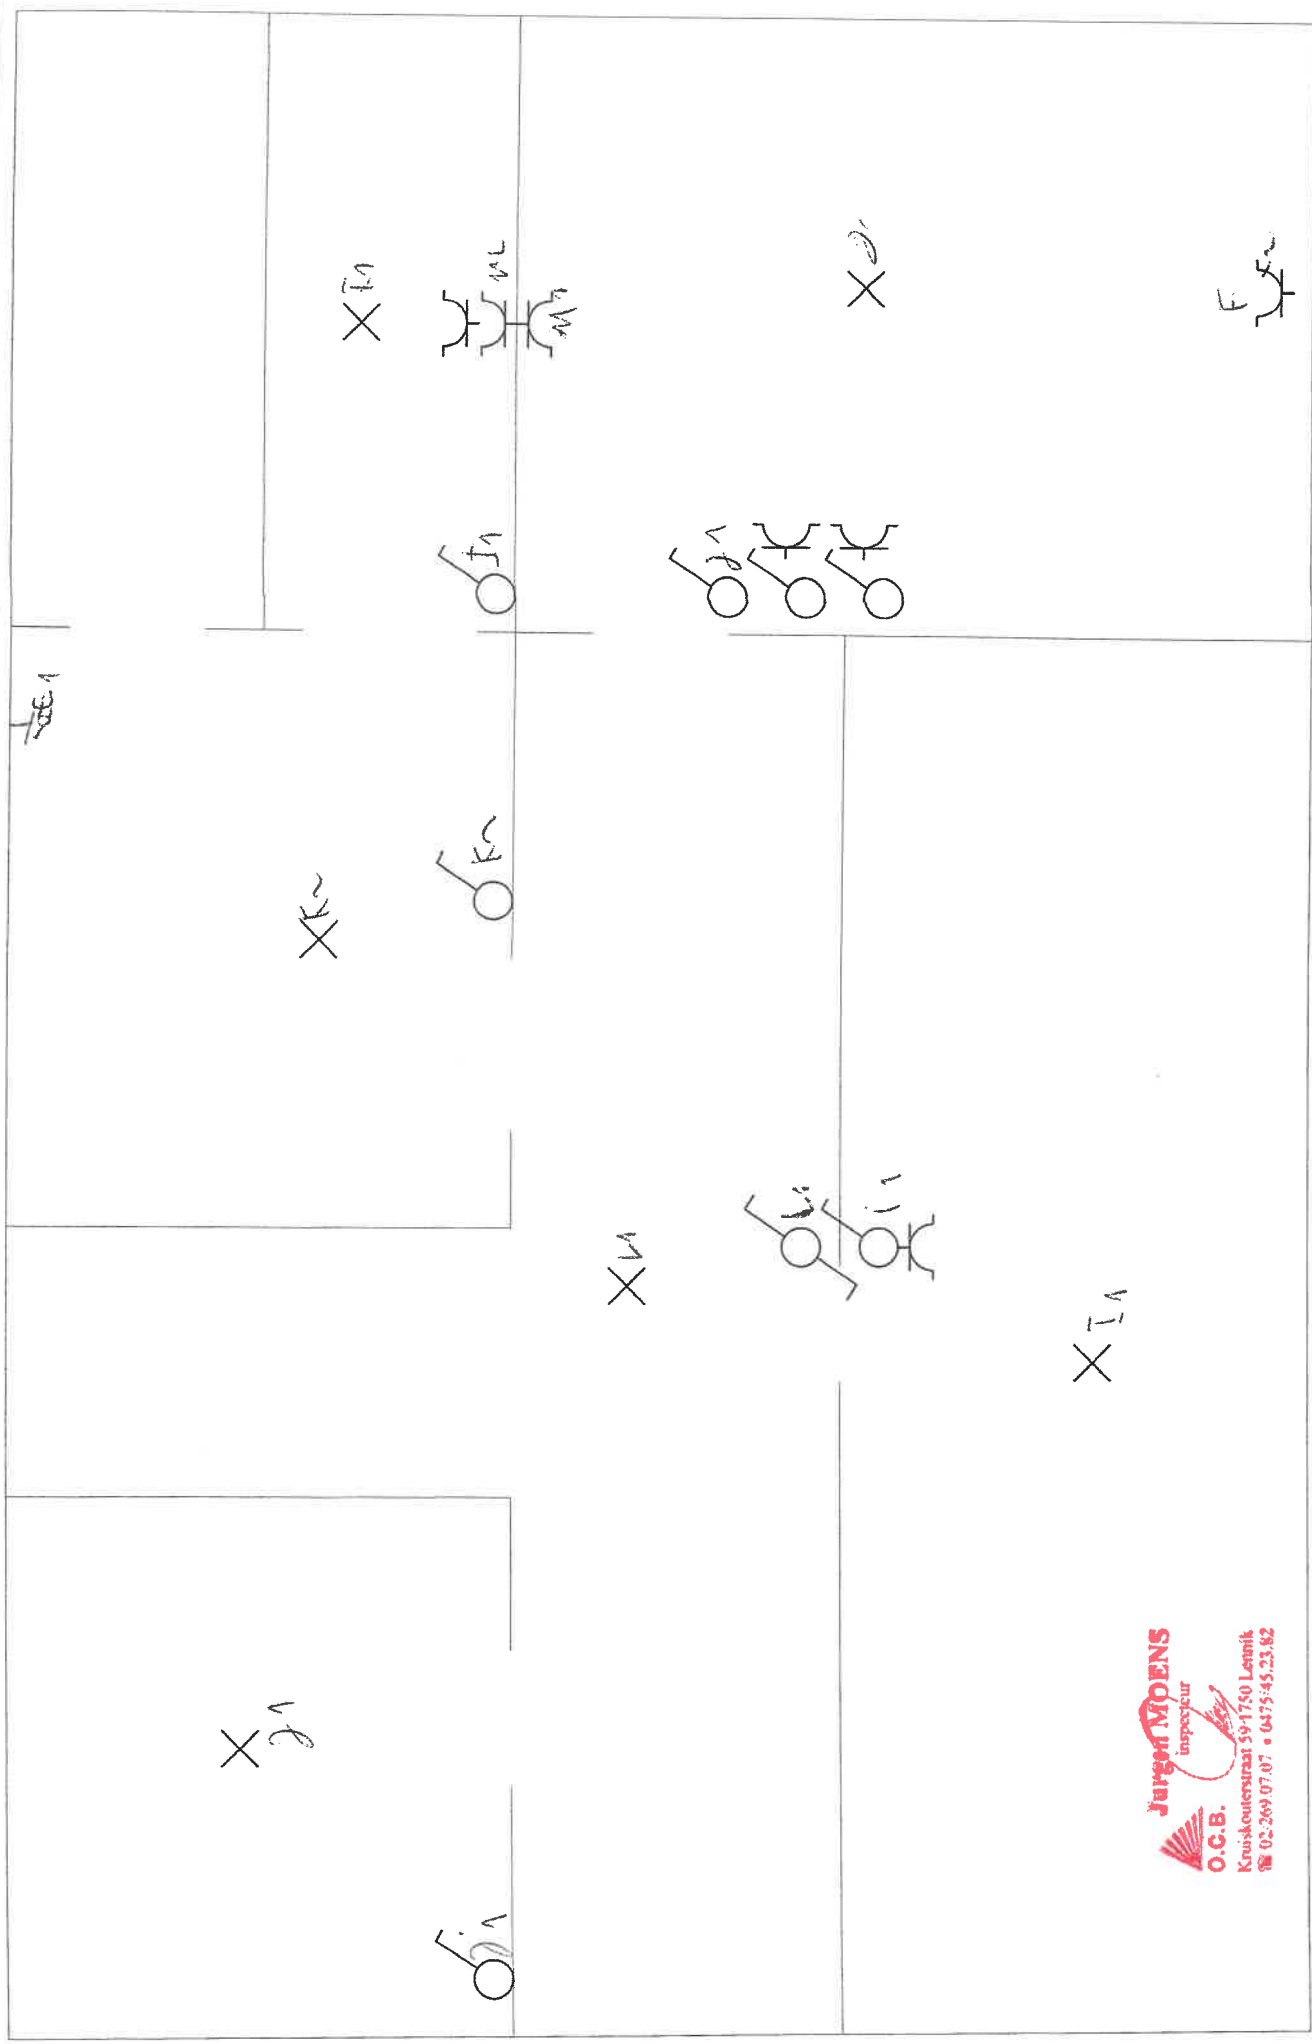

Jurgens Moens
inspecteur
O.C.B.
Kruiskoutersstraat 59-1750 Lennik
☎ 02-269 07 07 • 0475-45 23 82

Erik Deschrijver bosstraat 28 1700 dilbeek	Titel van het bestand		Ontvanger	Datum	Wijzigingen	Datum van het bestand
	grondplan		Deijlère Michiel			4/4/16
	OnderTitel van het blad		Tekenaar			Datum van het blad
	grondplan kelder		koolwijje 20			4/4/16
			Verificateur			
			1700 dilbeek			
						Dit blad wordt door het programma SEE TECHNICAL van de groep IGE-XLO ontvraagd
						1 / 3

1 2 3 4 5 6 7 8

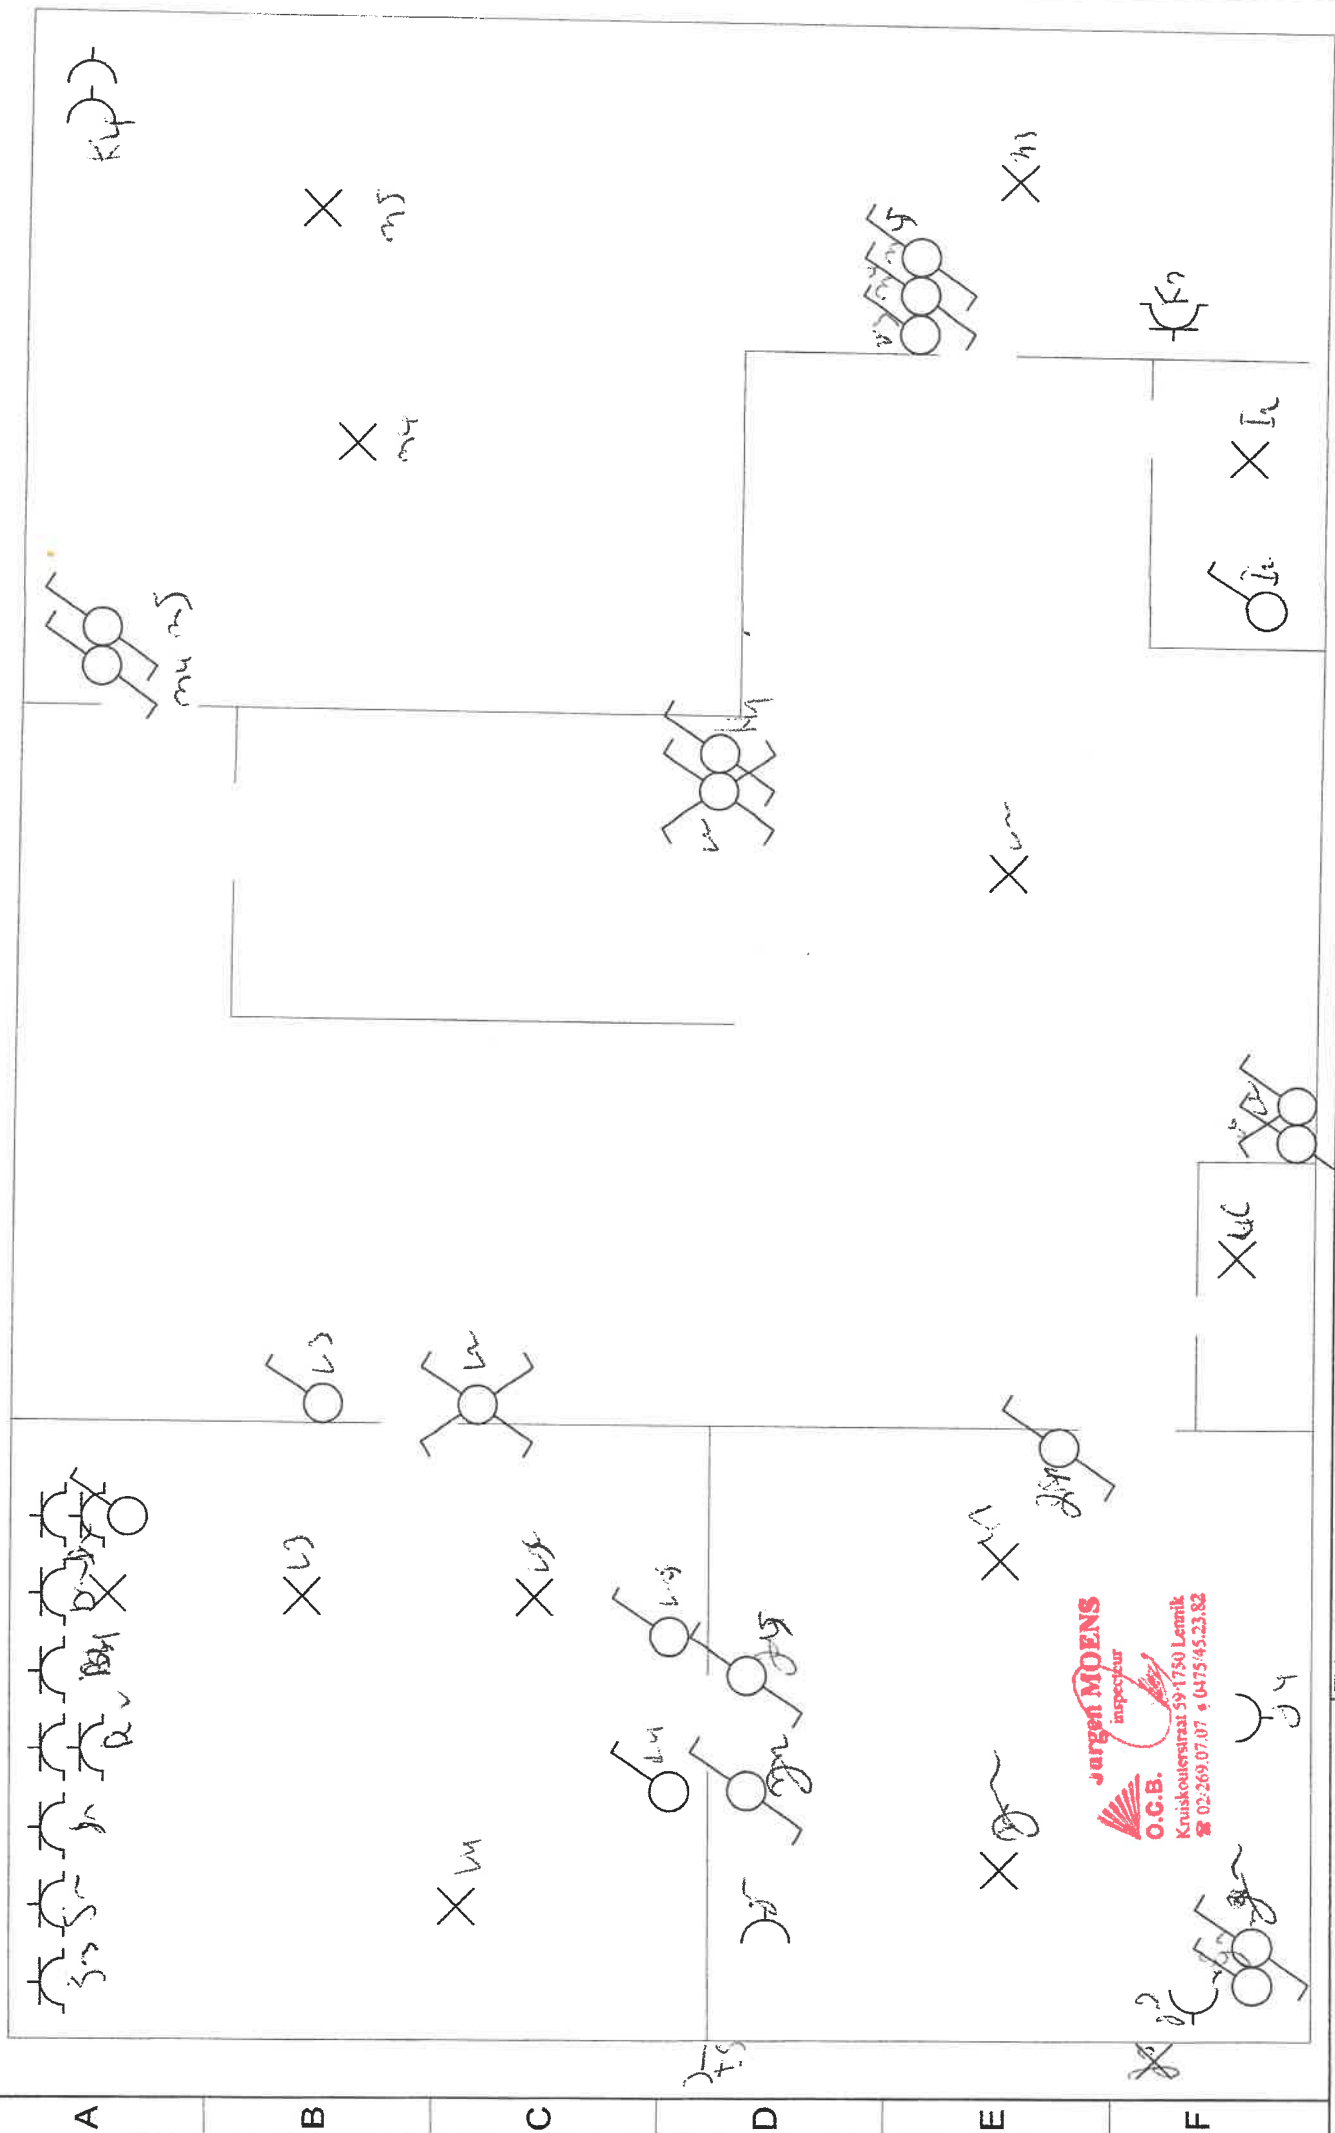

Erik Deschrijver bosstraat 28 1700		Titel van het bestand grondplan grondplan gelijkvloer		Ontvanger Jellière Michiel Tekenaar koolwijte 20 Verificateur 1700 dilbeek	Datum 4/4/16	Wijzigingen 4/4/16	Datum van het bestand 4/4/16
---	--	--	--	---	-----------------	-----------------------	---------------------------------

Dit blad wordt door het programma SEE TECHNICAL van de firma IGE XAO ontworpen
2/3



Erik Deschrijver

00

dilbeek

Titel van het bestand

grondplan

Ondertitel van het blad

grondplan
verdiep

Ontvanger	Datum
Deilère Michiel	
Tekenaar	
Koolwijte 20	
Verificateur	
1700 dilbeek	

Datum van het bestand
4/4/16
Datum van het blad
4/4/16
