



Verslag

VERSLAG NR

GEN/15/61168147/00/NL/000



040 - INSP

Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

Brusselseheerweg 31 - 9400 Ninove



Uitgevoerd op: 27/03/2023



Uitgevoerd door: JAN LADON (5749)

Conform

IDENTIFICATIE VAN DERDEN

Opdrachtgever van de controle

Naam, Voornaam Van Herzeele Bernard

Adres Pierlalaweg 1- 9910 Aalter

Eigenaar, uitbater of beheerder

Naam, Voornaam De Greve Matte

Adres Brusselseheerweg 31 - 9400 Ninove

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk

Naam, Voornaam Van Herzeele Bernard

Adres Pierlalaweg 1- 9910 Aalter

IDENTIFICATIE VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Vinçotte ID 100 160 009

Adres Brusselseheerweg 31 - 9400 Ninove

EAN-code Niet meegedeeld

Netbeheerder naam Fluvius

Type installatie HUISHOUDELIJKE Inst.

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme / Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België, tel: +32 9 244 77 91 - buildingnorth@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis BE25 2100 4144 1482 BIC: GEBABEBB



Verslag

VERSLAG NR
GEN/15/61168147/00/NL/000

GEGEVENS VAN DE CONTROLE

De controle wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (B.S. van 28/10/2019), in dit document "Boek 1" genoemd.

Type controle	- Gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)
Datum van de uitvoering van de installatie	- Vanaf 01/06/2020
Informatie inhoud controle	- Alleen de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden gecontroleerd. - De verlichtingsarmaturen waren niet geïnstalleerd op het moment van onze controle. - De badkamer/doucheruimte was op het moment van onze controle nog niet geïnstalleerd/voltooid. - De volledig uitgeruste keuken was nog niet geïnstalleerd op de dag van de inspectie.
Afwijkingen	- Geen

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Spanning (V)	400Vn
Aard van de stroom	Driefasig
Type van aardelektrode	Aardingslus
Voedingsleiding - Type	XVB
Voedingsleiding - Doorsnede (mm ²)	16
Aantal eindstroombanen	21
Type van het aardverbindingssysteem	TT
Huidige nominale waarde van de bescherming van de aansluiting	Niet zichtbaar
Installatie ontworpen voor een maximale nominale stroom van (A)	40
Geplaatste (alg.) differentieelstroominrichtingen	2

Differentieel	In(A)	Gevoeligheid (mA)	Type
Diff 300mA	40	300	A

Beschrijving van de elektrische installatie

ALSB


Plaats Inkomhal naast de teller

Aantal
differentieelstroominrichtingen


2

Aantal stroombanen

21

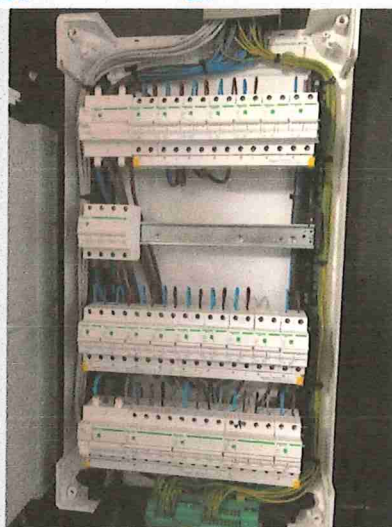

(Inwendige foto)

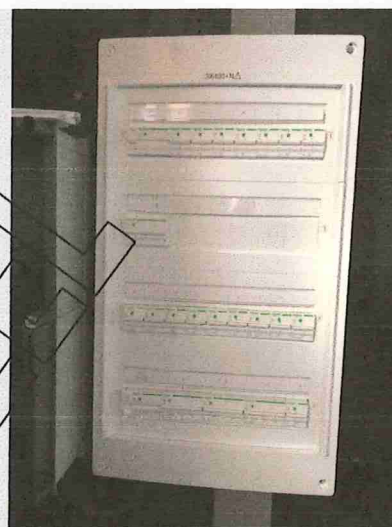

(Uitwendige foto)

Type of aarding

Aardingslus

Waarde (Ω)

3.09

SCHEMA'S, PLANNEN EN DOCUMENTEN VAN DE INSTALLATIE

Stroombaanschema - referentie Eendraadschema

Stroombaanschema - versie 1

Stroombaanschema - datum 27/03/2023

Eendraadsschema Zie bijlagen

Situatieplan - referentie Situatieplan

Situatieplan - versie 1

Situatieplan - datum 27/03/2023

Situatieplan Zie bijlagen



RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Uitgevoerde controles

Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen	In orde
Staat van het vast geïnstalleerd elektrische materieel	Ok
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking	Ok
Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	In orde
Visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	N.V.T.

Metingen en beproevingen

Spreidingsweerstand van de aardverbinding(en) (Ω)	3.09
Waarde van het algemeen isolatieniveau (M Ω)	14
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (testknop)	Niet getest
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (fourtus)	Niet getest
Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders	Ok

Vastgestelde inbreuken

- Nihil

Opmerkingen

Douchekamer

- Bijkomende equipotentiaal verbinding niet zichtbaar/niet bereikbaar



Verslag

VERSLAG NR

GEN/15/61168147/00/NL/000

BESLUIT VAN DE CONTROLE


De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 (KB van 8/09/2019) inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Er dient gevolg gegeven te worden aan de opmerkingen/aanbevelingen die in dit verslag geformuleerd zijn.

Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór 27/3/2048.

De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werd verzegeld.


Ing. J. Windey
Directeur-generaal Vincotte

VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

Bijlagen

Foto situatieplan (1/3)

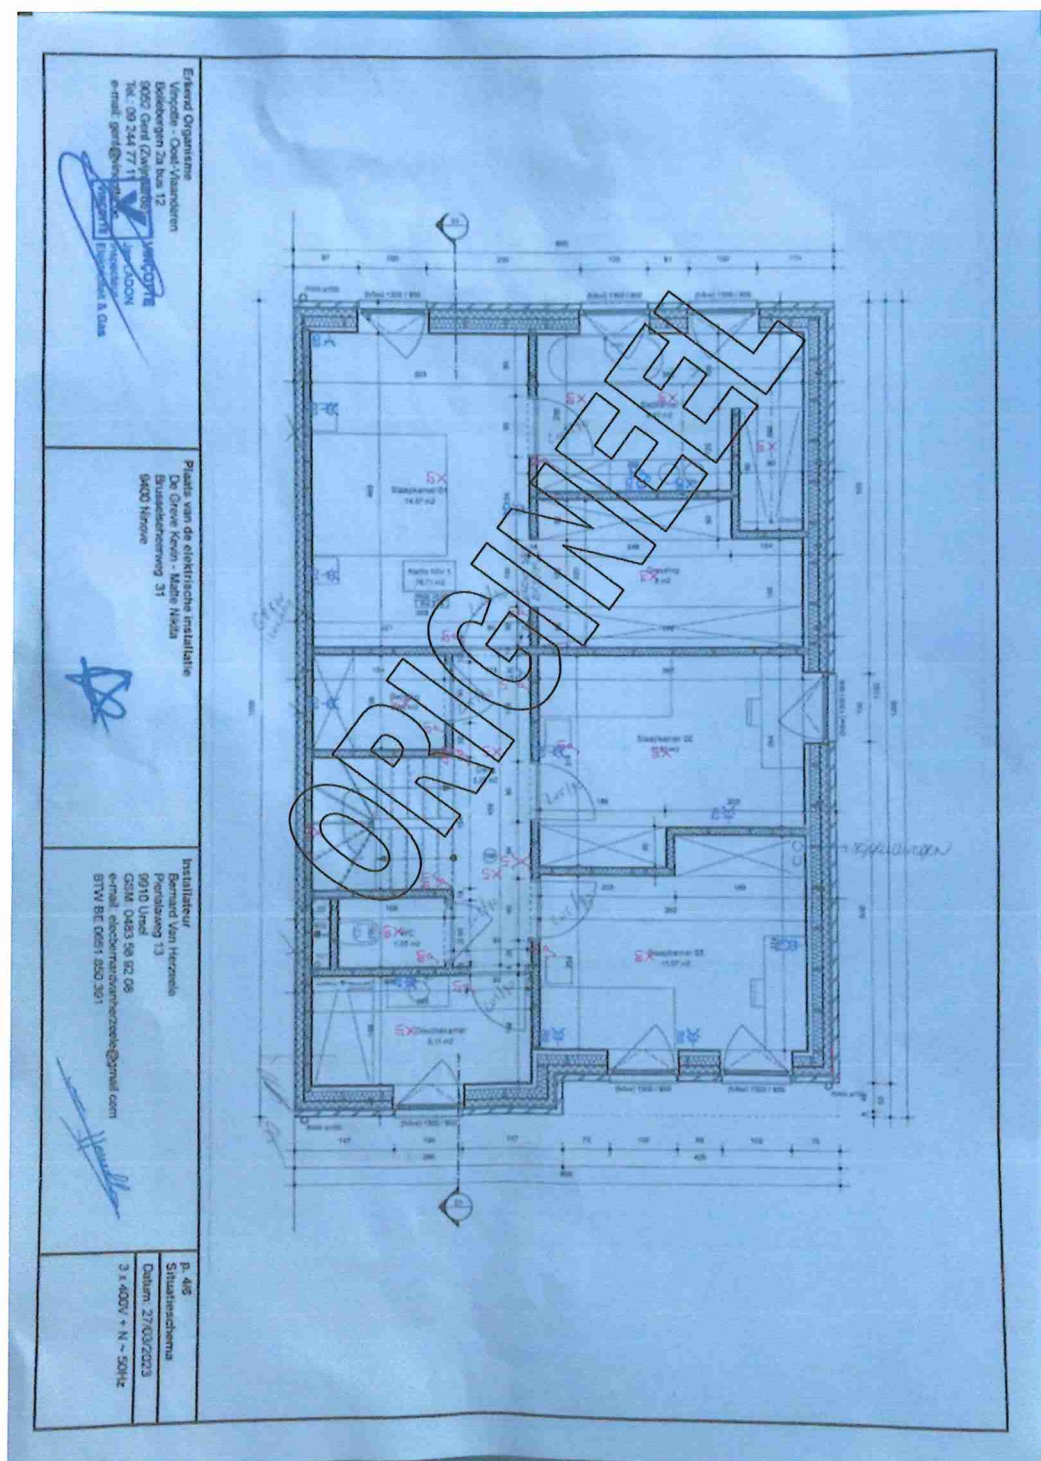


Foto situatieplan (2 / 3)

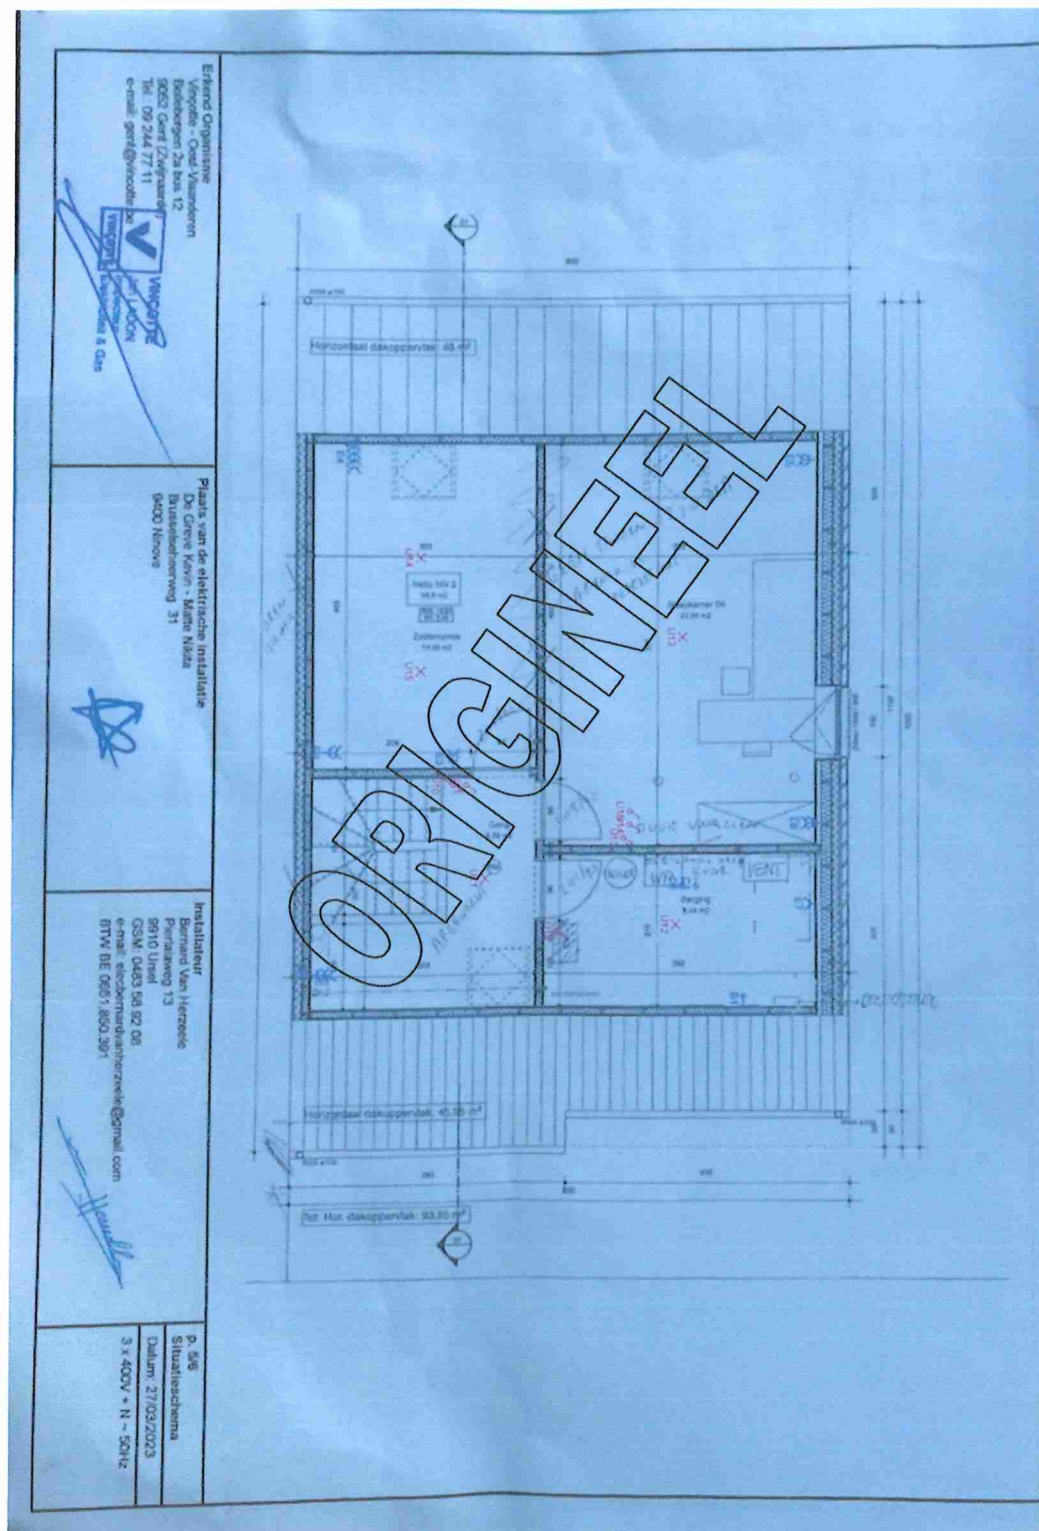


Foto situatieplan (3 / 3)

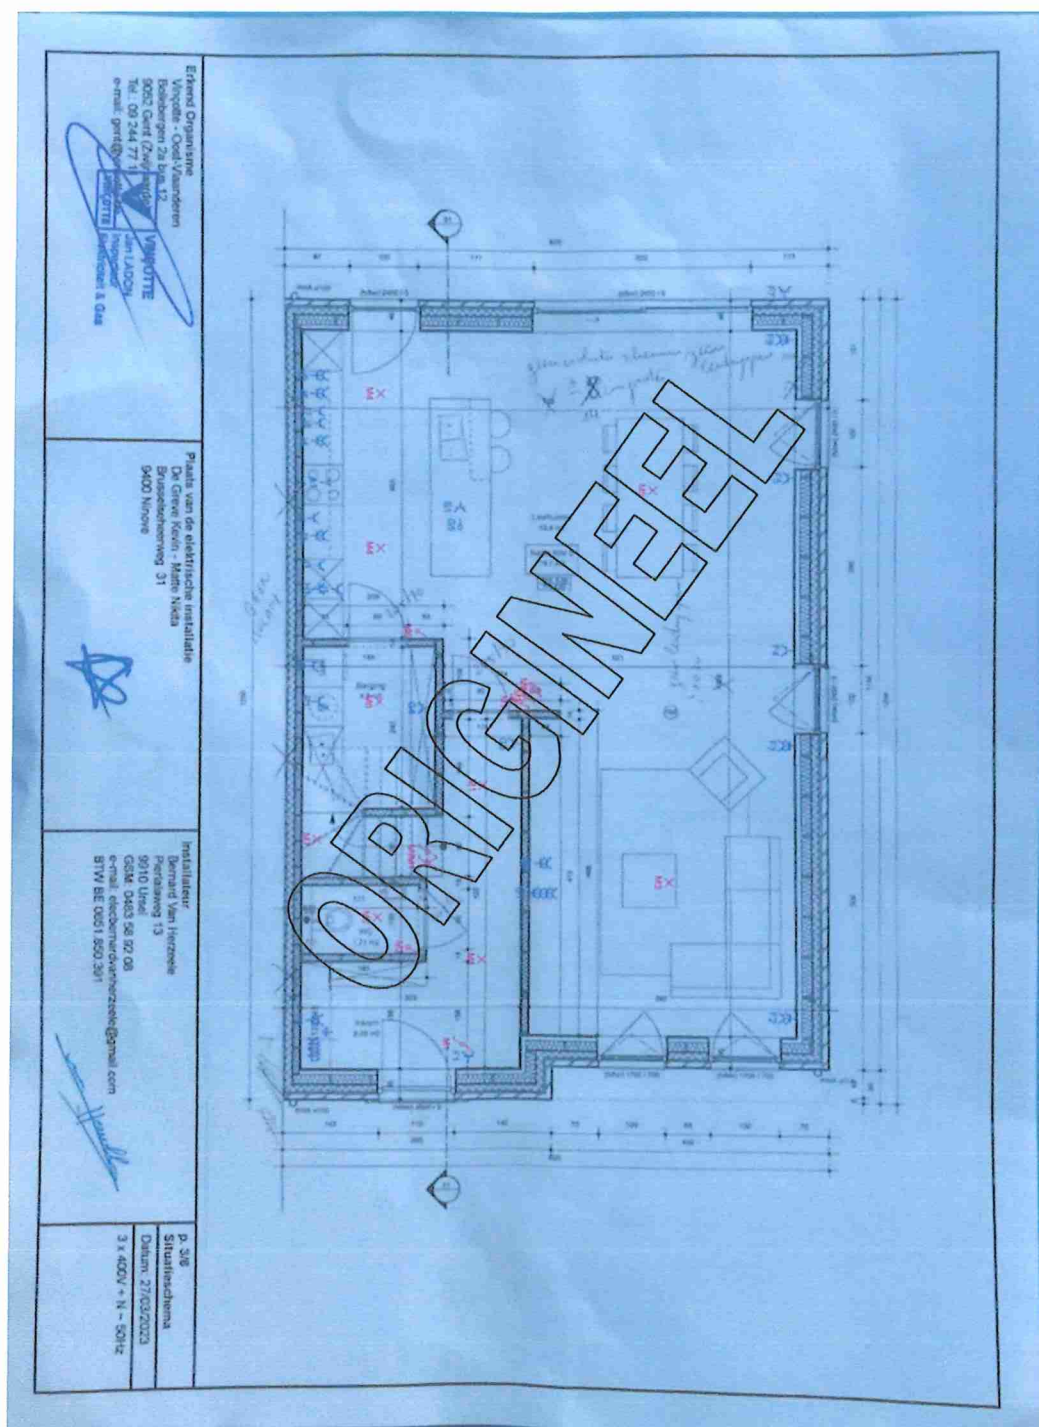


Foto van de eendraadschema's (1/2)

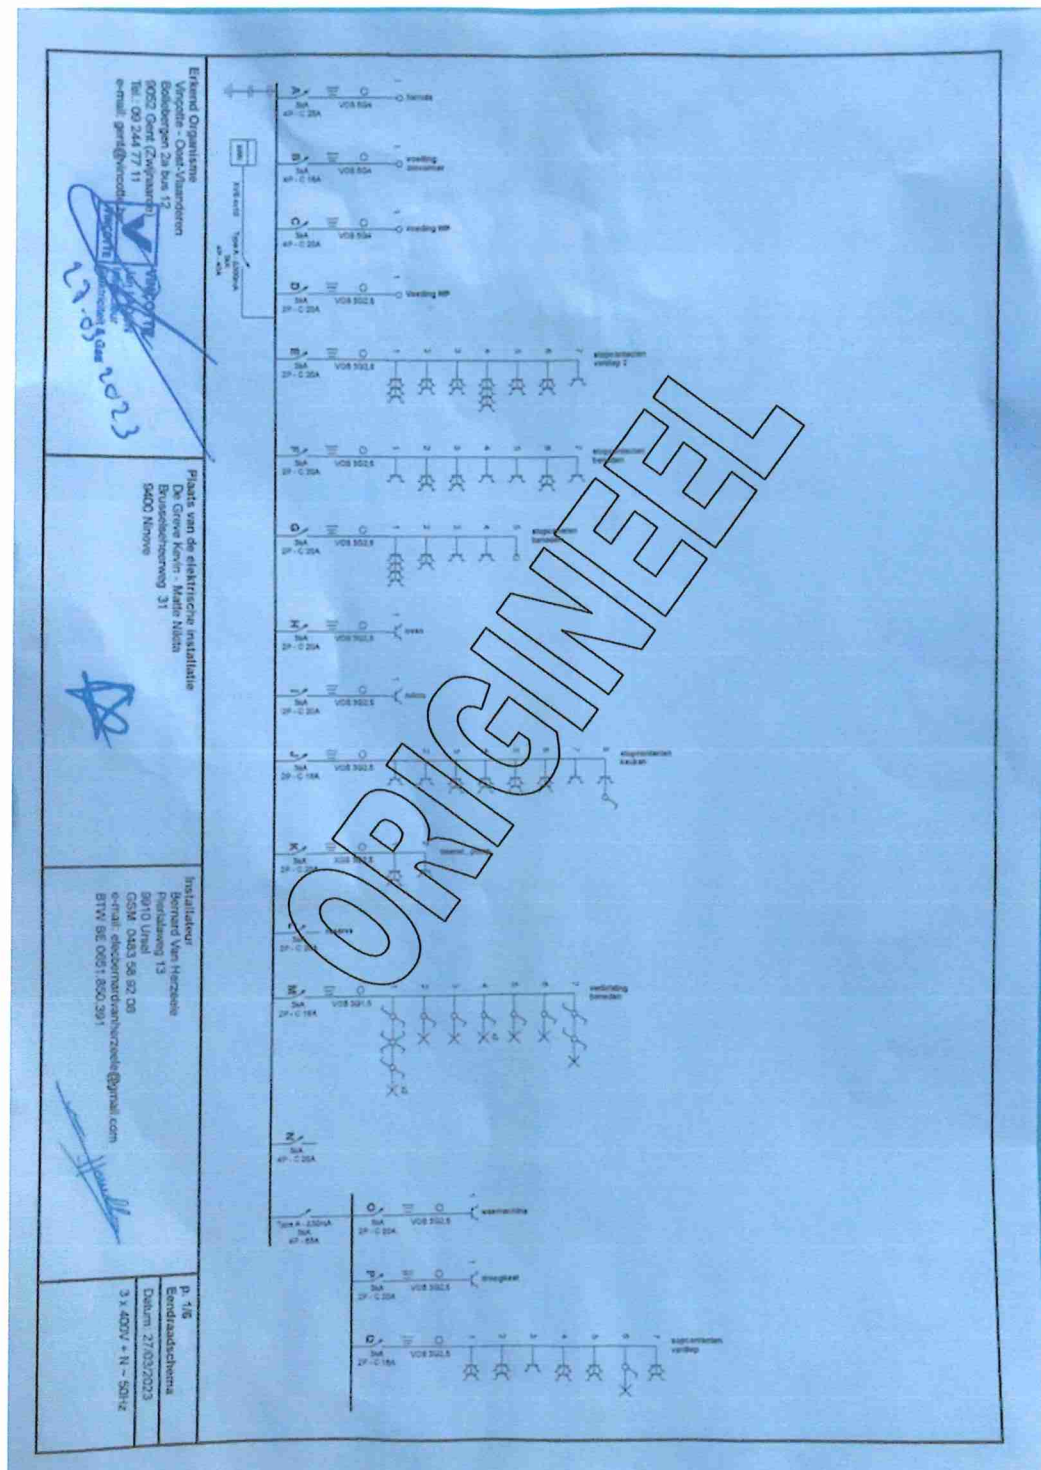


Foto van de eendraadschema's (2 / 2)

Erkend Organisme Bouwen - Oud Vlaanderen Bouwen - Oud Brussel 8000 Gent (Zaaiwilde) Tel: 09 244 77 77 e-mail: info@vincotte.be vincotte.be Vincotte Inspection & OSA	Plaats van de elektrische installatie De Oude Kerk - Maria Nieuw Boudo Heuse	Installateur Bernard Van Herzele Pierlaan 13 3010 Uude 0344 4403 66 62 06 bernard.vanherzele@gmail.com BTW BE 0001 600.391	p. 206 Eendraadschema Datum: 27/03/2023 3 x 400V + N - 50Hz
