

KEURINGSORGANISME
IBAN:
http://www.inspectbelgium.be
Opdracht: 19244
Klant / Bedrijf: Elodie Eeckhout

INSPECT BELGIUM asbl/vzw
BTW BE0647601296
Avenue Eiffel, 8
Klantnr.: 00021924
Adres: Denderhoutembaan 79, 9400
Ninove
Voorl.verslagnr.: 2019091900

TEL +32 10 280 577 - +32 15 860 460
info@inspectbelgium.be
Schaliënhoeverdreef, 20 T 2800 Mechelen
Contactpersoon:
BTW:
Uitgiftedatum: 2021-09-30



Verslagnr: 20210007802-V.2

ORIGINEEL EXEMPLAAR

VERSLAG VAN HET CONTROLEBEZOEK VAN EEN BESTAANDE ELEKTRISCHE L.S. en Z.L.S INSTALLATIE

ALGEMEENHEDEN

Aard installatie: Bestaande
Plaats van onderzoek: (verdiepingen) - Denderhoutembaan 79, 9400 Ninove
Referentie: Boek I Hoofdstuk 6.5., Boek I Afdeling 8.2.2., Boek 1 Afdeling 8.2.1
Inspectiedatum: 30-09-2021
Inspecteur: Joshua STROOBANTS
Eigenaar: Elodie Eeckhout
Cont.Pers.:
RRN: 94.02.24-322.73 **Uitgereikt te:** Beersel
Referentie documenten:
Ref PV Précédent: 2019091900
Conclusion PV Précédent: Non Conforme

Type lokalen: Appartement
Aard onderzoek: Controlebezoek
Andere reglement:
Volgende controle op: 30-09-2046 of binnen de: 300 maanden
Installateur: Elodie Eeckhout
B.T.W.:
tel.:
Datum: 29-09-2025

Date PV Précédent: 24-01-2020
Organisme ayant émis le rapport précédent:

BESCHRIJVING ELEKTRISCHE AANSLUITING

Benaming van de onderneming die de elektriciteit verdeelt: FLUVIUS
EAN nr.: **Teller:** 4116605-2018 **Merk:** Itron
Aansluiting: Souterrain ou aérien (Ondergronds of bovengronds)
Dienstspanning: 3N400V **I max. aansluiting:** 40A
Meter-bordverbinding: **Kabeltype:** VOB

Type stroom: Wisselspanning
Stand I: 481,0 **Stand II:** 608,0
Bescherming van de hoofdaansluiting:
aut. 4p 25A
Aantal geleiders: 4 **Doorsnede:** 10 mm²

VISUELE CONTROLES - METINGEN - TESTEN

Geviseerd en conforme schema's : JA
Beschrijving installatie: ☒ zie schema in bijlage
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken:
Differentiële testen per testknop: in **Foutlus controleren:** in orde
orde
Aardelektrode: **type:** Pennen
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Diff.algemene schak.: 4p 40A/300mA **Bijkomende differentieel:** 4p 40A/30mA
Nog niet geplaatst: Eclairages,
Aantal borden: 2
Geschiktheid tussen beveiligingsinrichtingen en doorsnede sectie: In orde
Diff-test. via foutstroom (2,5 tot 2,75 IΔn): In orde
Visuele inspectie van gevaarlijke vaste of stationaire apparatuur: In orde
Hoofddifferentiële ingangsaansluitingen verzegeld door mij opgesteld: Neen
De ééndraads- en situatieschema(s) moeten opnieuw worden ondertekend: Ja
Geschiktheid tussen het differentieel en de waarde v/d aardspreidingsweerstand: In orde

☒ **eendraadschema en situatieplan werd voor gezien getekend**
Staat van het vast elektrisch materieel (fixatie, degradatie ...): in orde
Rechtstreekse aanraking: in orde **Onrechtstreekse aanraking:** in orde
Algemene isolatieweerstand: 10,76
Mohm
Doorsnede: 16 mm² **Spreidingswaarde:** 20,3 Ohm
Aantal eindkringen : 11
Klasse I-apparatuur en equiptotentiaale verbindingen: In orde
Visuele inspectie van gevaarlijke verplaatsbare machine met vaste standplaats: N.V.T.

BESLUIT



DE INSTALLATIE IS CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd binnen de door dit Boek Voorgeschreven termijn (zie hierboven).

Voor de Technisch Directeur,
De Inspecteur,

VASTSTELLINGEN

Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk van Boek 1 (I) - Afwijking (D) - de nummers die verwijzen naar de standaard inbreuken

N11 - Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.

N12 - Het onderzoek beperkt zich tot de gemak. toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de instal. en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

N13 - Tenzij anders vermeld, betreft het onderzoek de goede staat en/of werking van de installatie, de opvatting is niet van toepassing.

Verslagnr: **20210007802-V.2**

De inspecteur verklaart dat hij al de stappen van de procedure heeft gevolgd. JA

ORIGINEEL EXEMPLAAR**ADVIES****Volgens de onderafdeling 6.5.7.2.b.7. van het Boek 1 is het verplicht te herinneren:**


- a) de verplichting het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Boek 1: AREI

goedgekeurd (of ingevoegd) door het koninklijk besluit van 8/09/2019.

N 3Kwatt

Elochie Eeckhout
 Denderhoutembaan 79
 3400 NINOVE bus 5

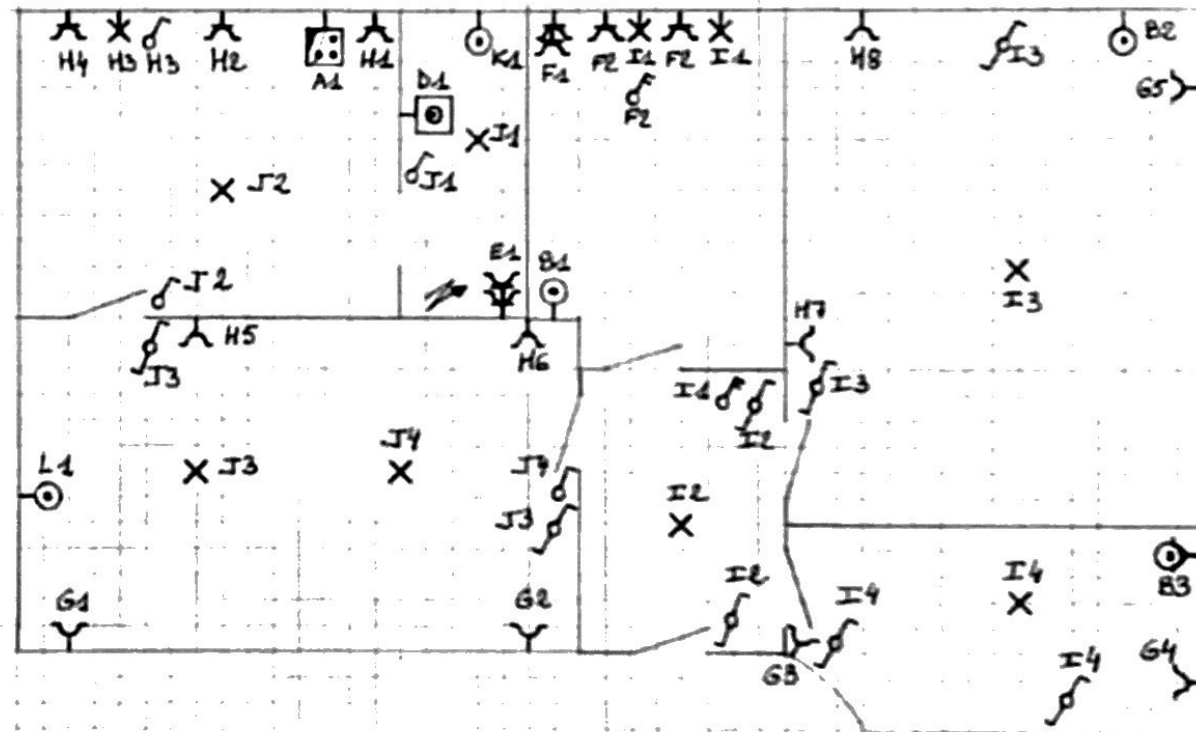

Installation contrôlée par :
 Installatie gecontroleerd door :
 Avenue Eiffel 8 - 1300 Wavre
 010/280 577
 015/860 460



Inspecteur: STROOBANTS Joshua

Date / Datum :

PV n° :

Signature / Handtekening :

ECKHOUT Elochie
 EDING-SESTEENWEG 253
 3400 NINOVE

Installation contrôlée par:
 Installatie gecontroleerd door:
 Avenue Eiffel 8 - 1300 Wavre
 010/280 577
 015/860 460




Inspecteur: STROOBANTS Joshua

Date / Datum:

PV n°:

Signature / Handtekening:

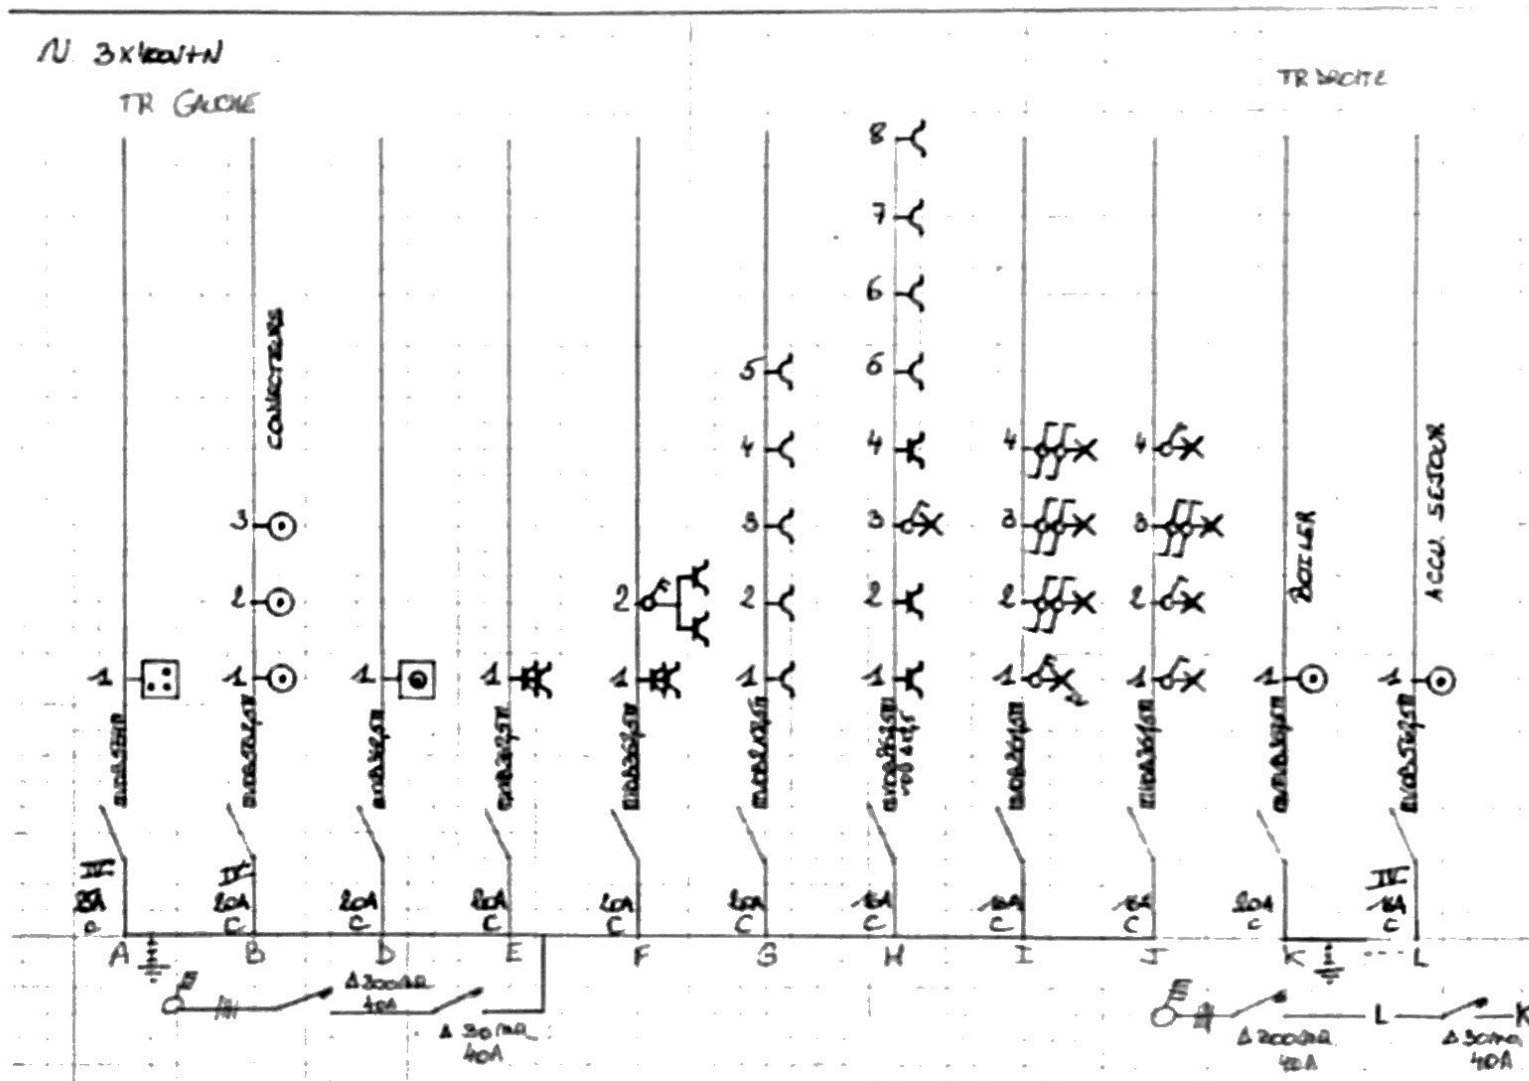

ECKHOUT Elodie
 EDINGSESTEEN WEG 253
 9400 NINOVE
